

設置チェックシート(OSNETパケット通信機 NetMAIL-N_BOX)

地点	実施日	年	月	日	実施者	天候
----	-----	---	---	---	-----	----

【通信機】


型 式 NetMAIL-N

製 造 番 号 No.

製 造 年 月 年 月

※ BOX内の接続順序

1. アンテナ接続
2. バッテリ接続
3. ACブレーカ”入”
or太陽電池パネル接続

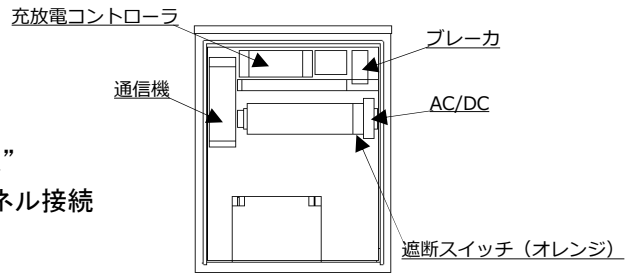

確認チェック項目		<input checked="" type="checkbox"/>
使 用 電 源	<input type="radio"/> AC仕様	
	ブレーカが”入”になっていること	<input type="checkbox"/>
	ブレーカ部で入力電圧がAC85V以上あること	<input type="checkbox"/>
	AC/DC出力部でDC13.5V以上あること	<input type="checkbox"/>
	<input type="radio"/> DC仕様	
	太陽電池パネル接続端子台に極性の間違いが無く確実に接続されていること	<input type="checkbox"/>
	遮断スイッチが確実に押し込まれていること	<input type="checkbox"/>
	太陽電池パネル部は日当たり良く受光部に遮蔽物が無いこと	<input type="checkbox"/>
	共通	
	バッテリー接続端子が確実に差し込まれていること	<input type="checkbox"/>
充放電コントローラのLED確認 (下図参照) ステータスLEDが緑点灯、バッテリー充電状態LEDが緑点滅すること	<input type="checkbox"/>	

通 信 機	各端子台やコネクタ部(通信ポート、アンテナケーブル)に緩みが無いこと	<input type="checkbox"/>
	電波の確認 アンテナ3本以上である事(推奨4本)	<input type="checkbox"/>
	通信機の電源電圧(DC10~15V)	<input type="checkbox"/>
	時計の確認(CT-1接続で確認)	<input type="checkbox"/>
	自動観測機器がすべて接続機器リストに登録されていること	<input type="checkbox"/>
	OSNET機器の時計合わせを実行し、正常に終了すること	<input type="checkbox"/>
	自動観測設定で『観測する』になっていること	<input type="checkbox"/>
観測メールアドレス: osiasp@is1.osasi-asp.jp / osiasp@tk1.osasi-asp.jp フィールド情報サービス使用時は上記アドレス(2件)を必ず設定すること	<input type="checkbox"/>	

現場名: _____

電波強度(アンテナ本数): _____ 本


現場メールアドレス: _____ @

通信機電源電圧: _____ V

ソフトウェア(ROM)バージョン: Ver ()

使用電源: ソーラー(DC) / 商用(AC)

充放電コントローラのLED確認



備考

観測開始時刻 時 分
